원창동 물류센터 대수선공사 - 통합 예정공정표

PROJECT : 원창동 물류센터 대수선공사(저온창고 상온화 및 레이아웃 공사)

주요공정	중분류	세부공종	공정명
■ 상세공정 — 저온창고 5개층 (2026.11.01 ~ 2027.04.30, 26주)			
건축공사	해체공사	가설공사	사무실설치
			비계설치
			비계해체
		해체공사	냉매회수, 고소장비입고, 판넬/바닥/몰라드 철거
			폐기물 반출 (층별로 수시 반출)
			폐기물 반출
	건축공사	미장공사	1층 타설/양생/폴리싱
			3층 타설/양생/폴리싱
			4층 타설/양생/폴리싱
			8층 타설/양생/폴리싱
			9층 타설/양생/폴리싱
		판넬공사	판넬 및 부자재발주 서류제출
			하지/OHD/방화셔터/판넬 설치
		도장공사	(벽체)수성페인트, 에나멜페인트, 주차선
		마감공사	방화문 자재발주 및 서류제출
			방화문설치 / 방화실란트
			볼라드설치
전기통신공사	전기통신공사	해체공사	고소장비입고, 전등, 전열철거
		간선 및 동력,전열, 전등공사	간선, 전등, 전열공사
소방공사	소방전기공사	자탐설비	자탐, 셔터감지기설치
		유도등설치공사	유도등설치
		비상방송 및 비상조명공사	비상방송, 비상조명설치
	소방기계공사	소방기계공사	소화전, 스프링쿨러 설치 및 점검

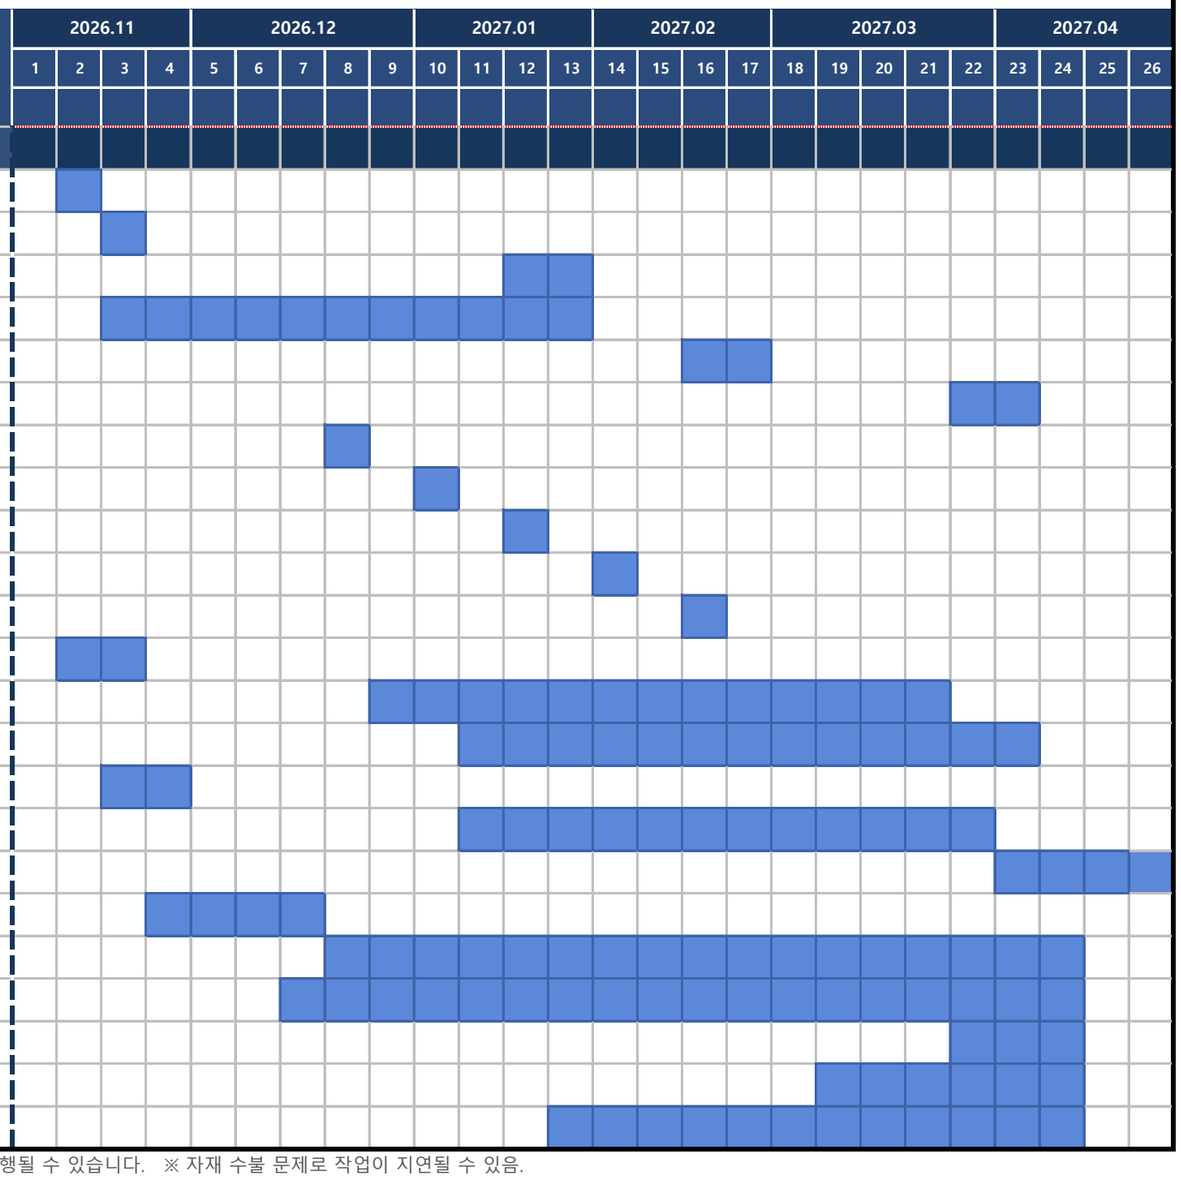

※ 상기 일정은 천재지변·현장 제반사항에 따라 변경될 수 있으며, 별도 협의 하에 조율하여 진행될 수 있습니다. ※ 자재 수불 문제로 작업이 지연될 수 있음.
